Ortsgemeinde Wasserliesch
Der Ortsbürgermeister

Ortsbürgermeister Thomas M. Thelen, In der Acht 4, 54332 Wasserliesch

Monatsbericht Nr. 12

Zeitraum:	Juli 2020
Projekt:	Ausbau der Römerstraße in der Ortsgemeinde Wasserliesch

Info Coronavirus-Pandemie:

Auch in Zeiten der Coronarvirus-Pandemie werden die Bauarbeiten zurzeit noch seitens den beauftragten Firmen durchgeführt. Ebenfalls finden die wöchentlichen Baubesprechungen nach wie vor statt.
Falls Aufklärungen zur Baumaßnahme bzw. deren Bauablauf seitens der Anlieger gewünscht werden, steht Ihnen nach wie vor unser Team Mittwoch´s ab 11:30 Uhr im Bürocontainer zur Verfügung. Wir bitten um vorherige Terminabsprache sowie Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen (Mundschutz).

Hinweis zum Halteverbot:

Um den Baustellenverkehr aufrecht zu erhalten wurden seitens der bauausführenden Fa. Elenz, Konz bergseitig im 3. BA (von der Kapellenstraße bis Anwesen Hs.-Nr. 98) Halteverbotsschilder aufgestellt. Ein Abstellen der Fahrzeuge talseitig ist nach wie vor möglich.

Allgemeine Information: Pflanzquartiere:

Aus technischen Gründen werden die geplanten Pflanzquartiere erst nach Einbau der bit. Deckschicht (letzte Asphaltschicht) hergestellt. Die Bauleitung wird die geplanten Standorte der Pflanzquartiere in der Örtlichkeit markieren, so dass sich jeder betroffene Anlieger nochmals ein Bild über die beabsichtigten Standorte machen kann. Aufgrund des Feedbacks der betroffenen Anlieger wird das Ergebnis dem Gemeinderat Wasserliesch vorgetragen.
Eine abschließende Entscheidung ob und in welchem Umfang die geplanten Pflanzquartiere realisiert werden, wird der Gemeinderat Wasserliesch festlegen. Nach der Entscheidung erfolgt nochmals eine Information an die betroffenen Anlieger.

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 2 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

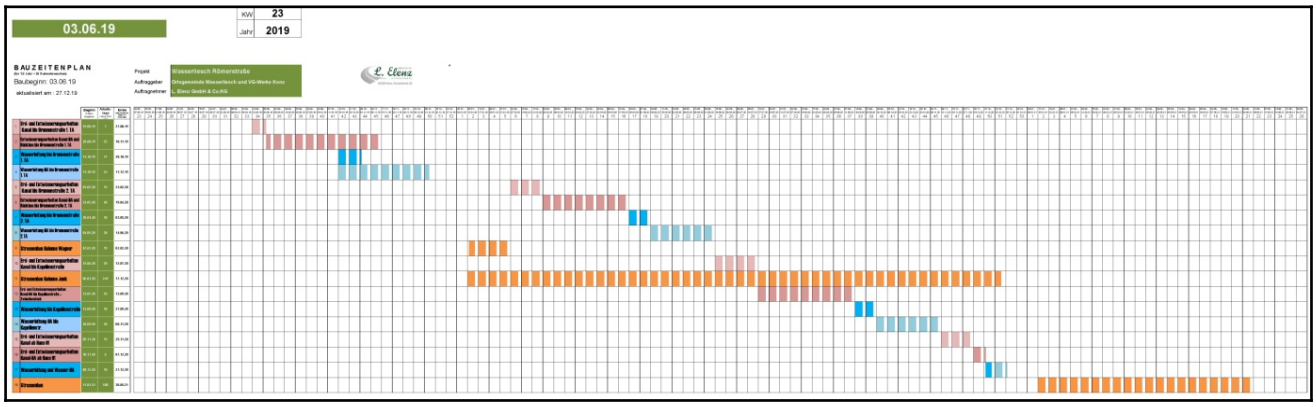

Bauzeitenplan: Stand 27.12.2019

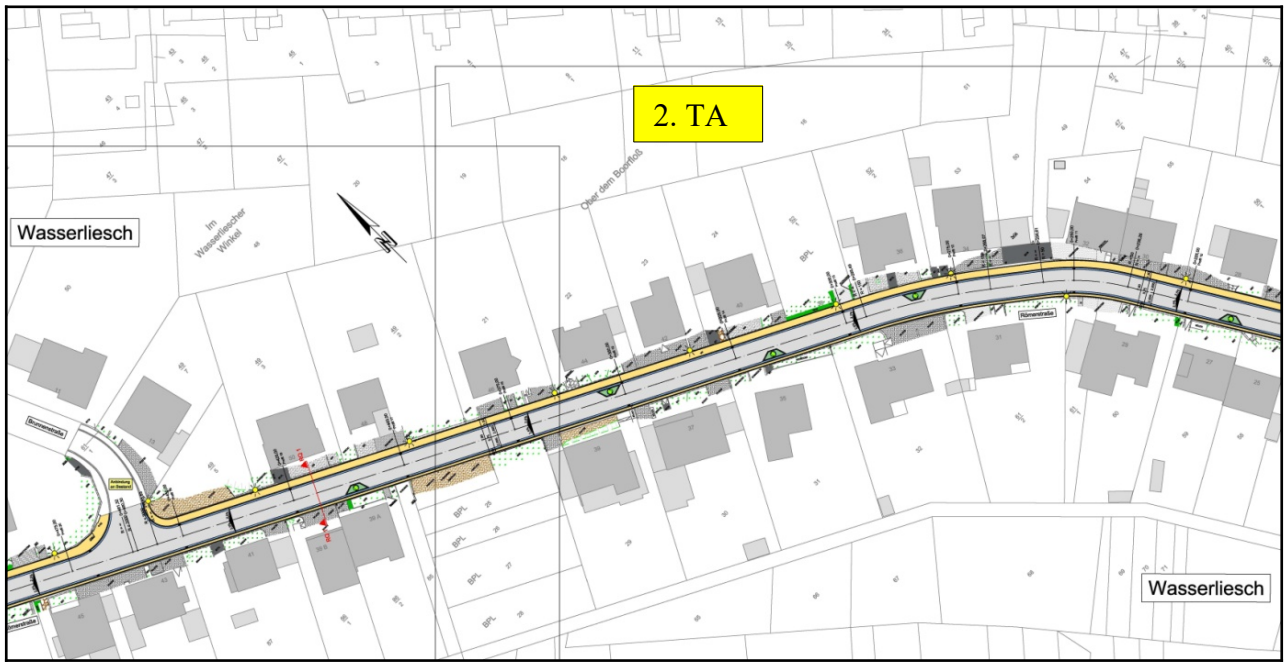

Lageplan Straßenbau 2. TA

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 3 zum Monatsbericht Nr. 11 (Zeitraum: Juni 2020)

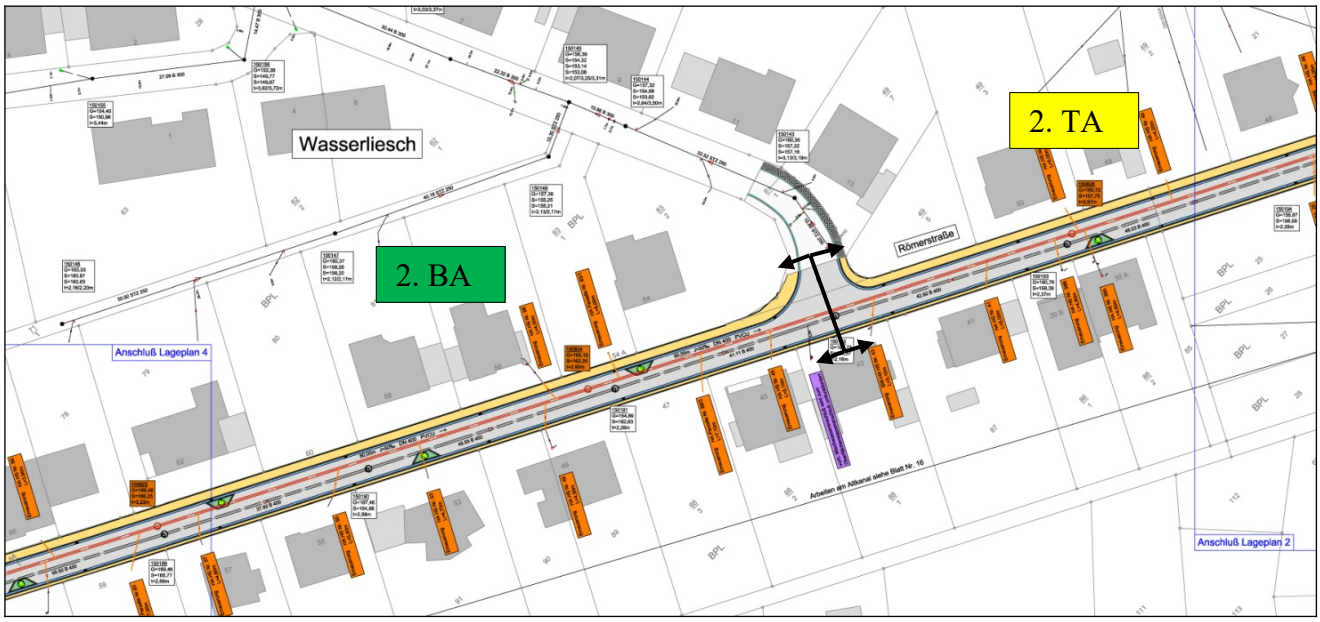

Lageplan Entwässerung 2. TA + 2.BA

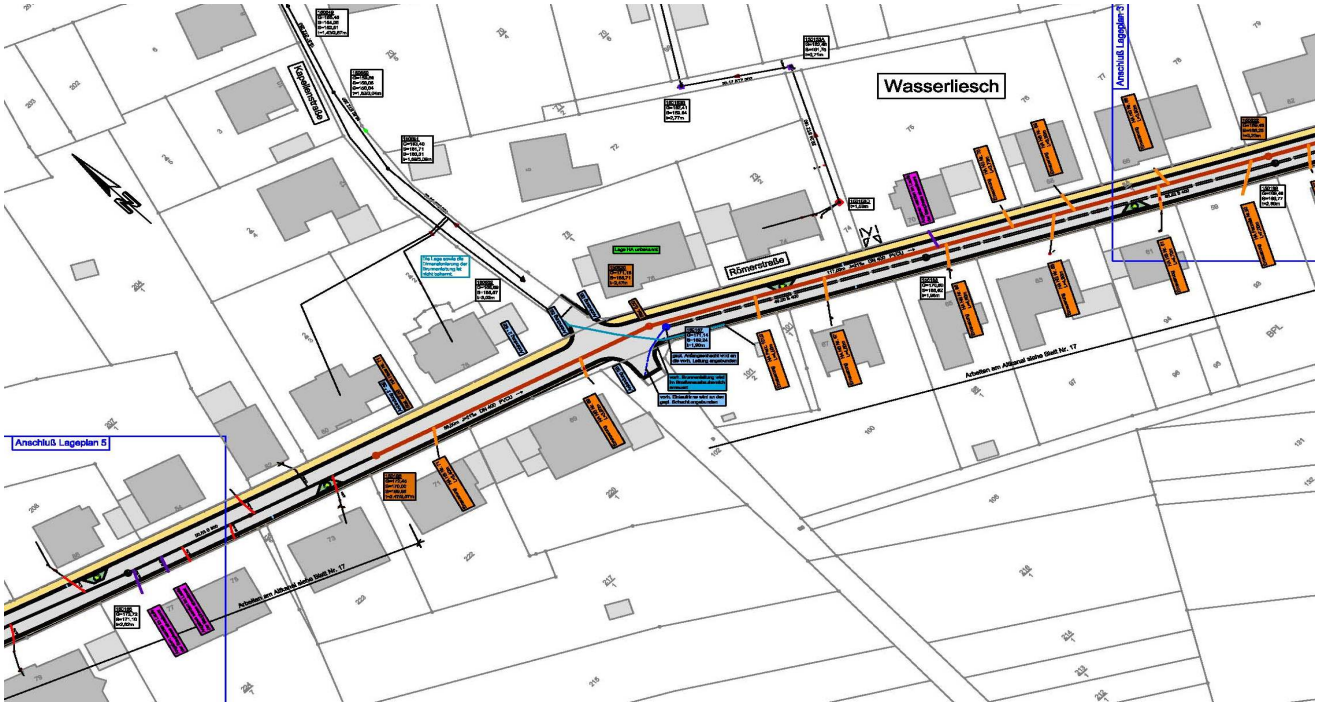

Lageplan Entwässerung 2. BA + 3. BA

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 4 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

- **28. KW 2020**
  Im 2. TA wurde mit den Ausschachtungsarbeiten für den Straßenausbau weiter fortgefahren. Insbesondere wurde die talseitige Gehweganlage abgebrochen. Im Bereich der Zufahrten bzw. Hauseingängen wurden provisorische Schotteranrampungen hergestellt.

Bild 1598

Bild 1601

Des weiteren wurde mit den Ausschachtungsarbeiten für die Kabelverlegearbeiten begonnen.

Bild 1595

Bild 1597

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 5 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Ebenfalls wurde mit den Entwässerungsarbeiten im 2. BA „Brunnenstraße“ bis „Kapellenstraße“ begonnen.

Zurzeit wird die Kanalhaltung 150822 nach 150824 verlegt.

Bild 1607

Bild 1610

- **29. KW 2020**
  Im Bereich des 2. TA´s wurde mit den Ausschachtungsarbeiten für die Kabelverlegearbeiten weiter fortgefahren.

Bild 1625

Bild 1627

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 6 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Parallel wurde mit dem Setzen der Fundamente für die neuen Straßenleuchten begonnen.

Leuchte Hs. Nr. 34 (ca. Stat. 275,00m)

Bild 1633

Leuchte Hs. Nr. 36 (ca. Stat. 300,00m)

Bild 1636

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 7 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Zurzeit wird, im Rahmen der Entwässerungsarbeiten im 2. BA, die Kanalhaltung 150820 nach 150822 verlegt.

Bild 1646

Schacht 150822
Bild 1641

- **30. KW 2020**

Im Bereich des 2. TA´s wurden die Ausschachtungsarbeiten für die Kabelverlegung weiter durchgeführt.

Bild 1660

Bild 1663

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 8 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Bild 1662

Leuchte Hs. Nr. 42 (ca. Stat. 330,00m)

Bild 1665

Leuchte Hs. Nr. 44 (ca. Stat. 365,00m)

Mit den Entwässerungsarbeiten im 2. BA wurde weiter fortgefahren und die Kanalhaltung 150820 nach 150822 weiter verlegt.

Bild 1678

Bild 1683

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 9 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

- **31. KW 2020**

Um, während der Urlaubszeit der Kolonne 1, eine Befahrung für die Anwohner im 2. Bauabschnitt zu gewährleisten, wurden sämtliche Gräben verfüllt und die Straße in einen provisorisch befahrbaren Zustand versetzt.

Bild 1699

Bild 1700

Im Bereich des 2. TA´s wurden die Ausschachtungen für die Kabelverlegearbeiten weitergeführt.

Bild 1695

vorh. Telekomleitung

Bild 1685

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 10 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Gemäß Absprache mit den Versorgungsträgern wurden für Westnetz, Telekom und Vodafone sowie für die Verbandsgemeindewerke Konz entsprechende Leerrohre, im Kreuzungsbereich der „Brunnenstraße“, für die zukünftige Kabelverlegung verlegt.

Bild 1689

verlegte Leerrohre

Bild 1696

Das Setzen der Leuchtenfundamente wurde weitergeführt.

Bild 1686

Leuchte Hs. Nr. 50 (ca. Stat. 430,00m)

Bild 1694

Leuchte Hs. Nr. 54 (ca. Stat. 475,00m)

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr

Seite 11 zum Monatsbericht Nr. 12 (Zeitraum: Juli 2020)

Die Kanalhaltung 150820 nach 150822 wurde fertiggestellt.

Schacht 150820

Bild 1704

Bild 1705

- Gegenüber den geplanten und ausgeschriebenen Leistungen gibt es zurzeit keine Abweichungen.
- Gegenüber dem aktuell aufgestellten Bauzeitenplan (Stand: 27.12.2019) befinden sich die Arbeiten zurzeit ca. 3 Wochen in Verzug.

Gemeindebüro: In der Acht 4, 54332 Wasserliesch
Tel. 06501 – 14749 Fax: 06501 - 6085794
Privat: 06501 – 96 96 260
Mail: buergermeister@wasserliesch.eu
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr
